RAMBØLL

Rautjärven kunta, tekninen keskus
Simpeleen yhtenäiskoulu

Yleisaikataulu alueittain
11.3.2015

SEURANTA
10.6.2015
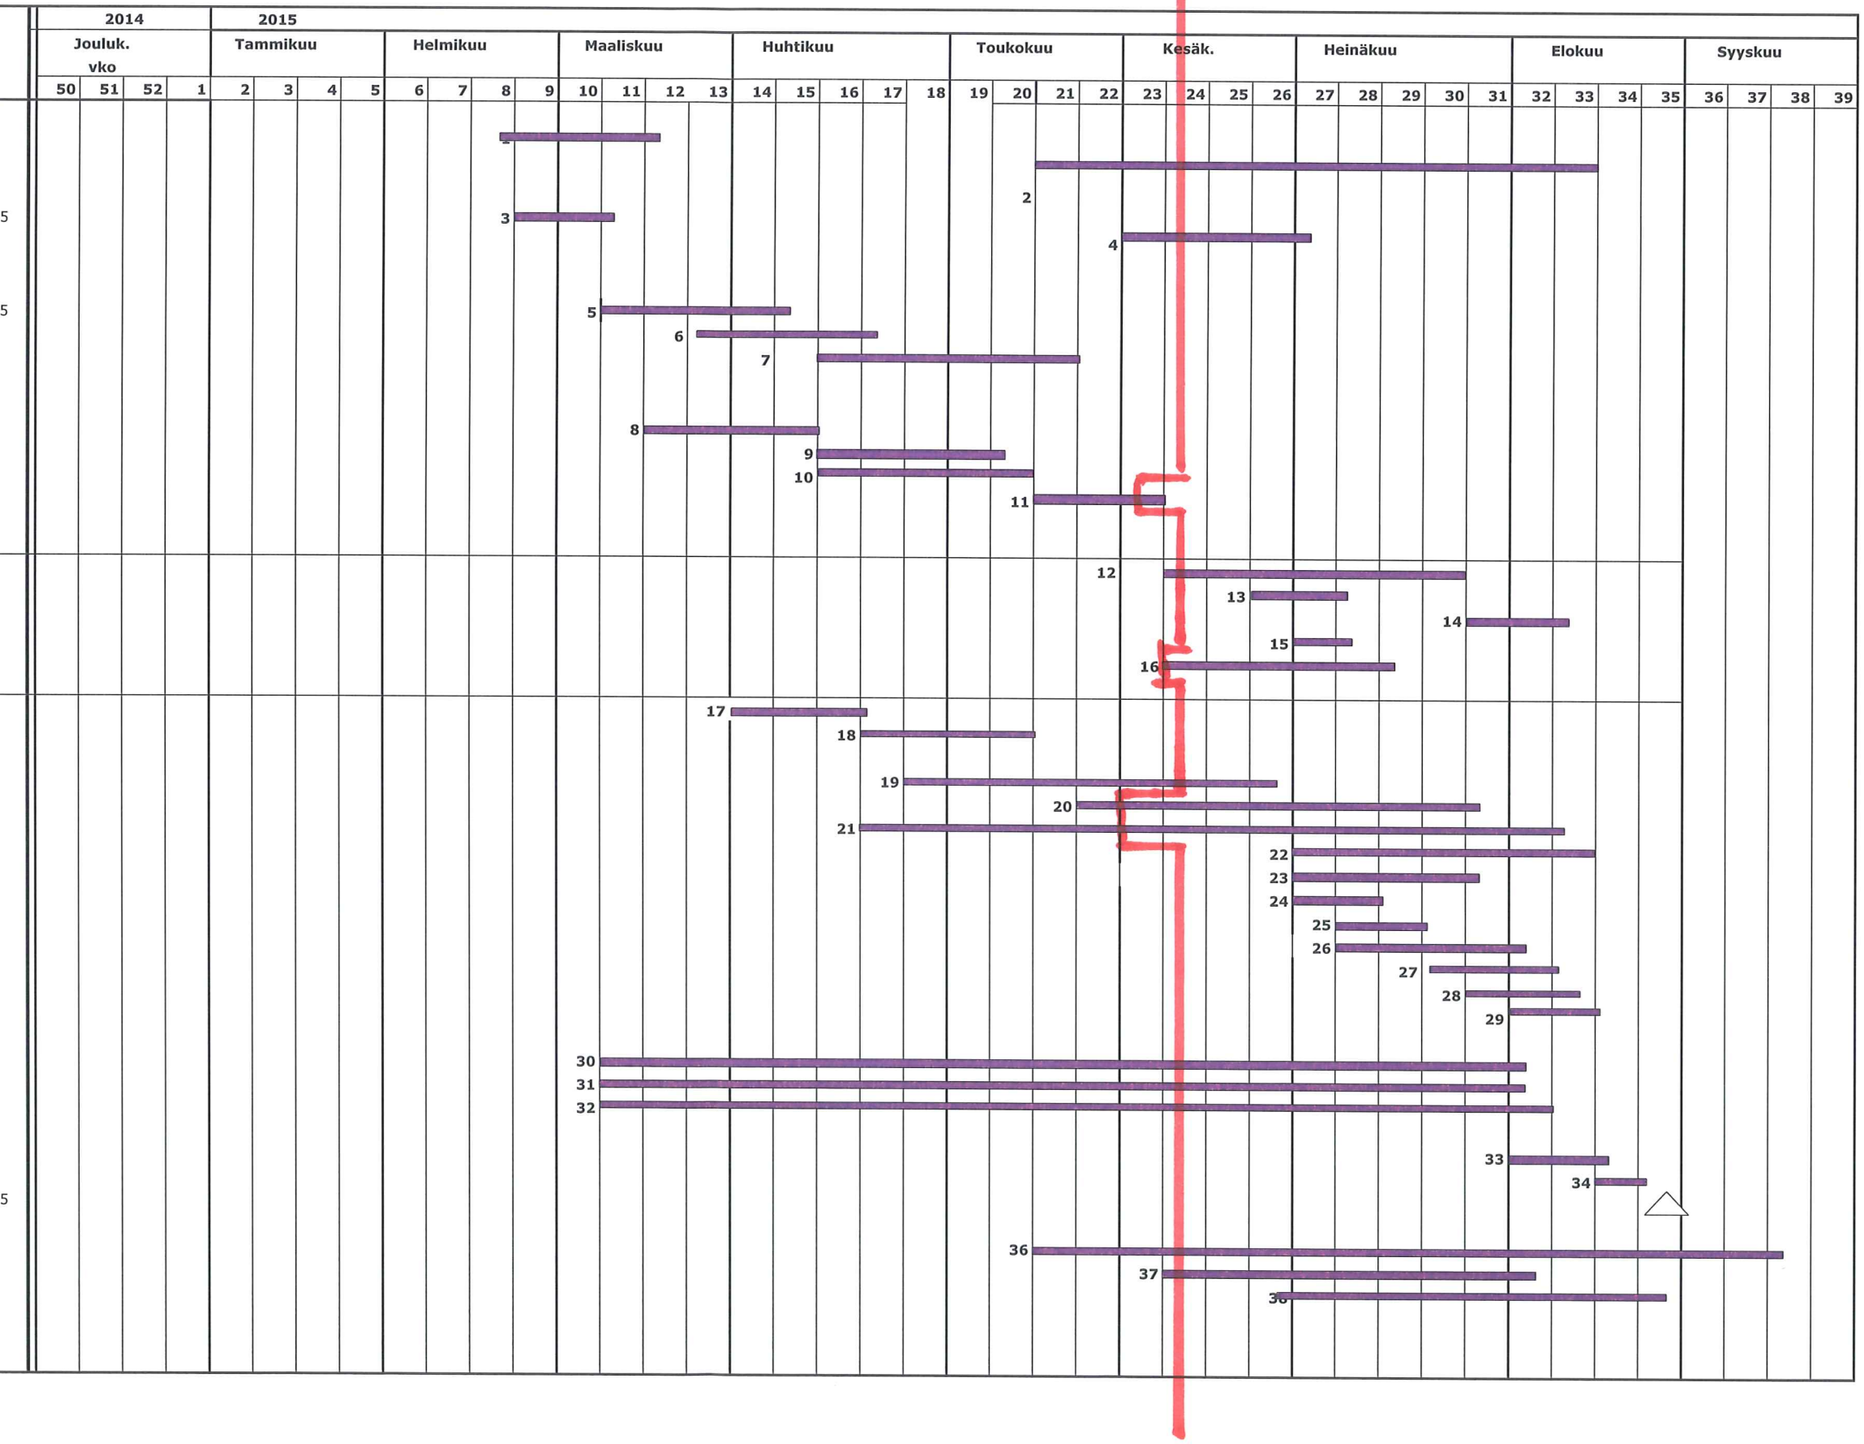
	Tehtävä/aika	alkaa	loppuu
1	**Mobilisointi**	9.3.2015	
	salaojat, kellarikerroksen		
2	**vesieristys**	18.5.2015	
3	**Väistötilat**		13.3.2015
4	**Jätekatos**		
	Kellarikerros		
5	**Purkutyöt, pintalattian piikkaus**	10.3.2015	10.4.2015
6	**MV-lattiat**		
7	**Väliseinämuuraukset**		
	Vesikatto		
8	**Huputus**	16.3.2015	
9	**Lämmöneristys**	13.4.2015	
10	**Vedeneristys**	13.4.2015	
11	**Kattovarusteet**		
	1. kerros Juhlasali		
12	**Alakatto**		
13	**Lattian hionta**		
14	**Lattian lakkaus ja pelialueiden rajat**		
15	**Jakoverho**		
16	**Ikkunoitten uusiminen**		
	Pukuhuoneet, 1. ja 2. kerros		
17	**Purkutyöt**	7.4.2015	
18	**Bet.valut, muuraukset**		
19	**Levyväliseinät**		
20	**Laatoitustyöt**		
21	**Tasoite- ja maalaustyöt**		
22	**Alakattotyöt**		
23	**Mattotyöt**		
24	**Metalliulko-ovet**		
25	**Metallisisäovet**		
26	**Väliovet**		
27	**Kalusteet**		
28	**Heloitus ja lukitus**		
29	**Opasteet ja varusteet**		
30	**LV-työt**		
31	**IV-työt**		
32	**Sähkötyöt**		
33	**Viimeistelytyöt**		
34	**Loppusiivous**		
35	**A-osa valmis**		28.8.2015
36	**Maanrak. Perustukset ja mv-lattia**		
37	**C- ja D-talojen työt**		
38	**Laajennuksen runkotyöt**
